



PROVINCIA DI COSENZA

EDILIZIA SCOLASTICA

"Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto Tecnico per il Turismo di Acquappesa danneggiato a seguito mareggiata del 21 – 24 Dicembre 2019" sito in via P. Mancini, Acquappesa (CS)"

COMUNE ACQUAPPESA (CS)

PROGETTO ESECUTIVO

GANTT

REL.
n°09

SCALA
1: =====

PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Michele Fida

Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Naccarato

Redazione	Revisione	Approvazione	data



PROVINCIA di COSENZA

Settore Edilizia scolastica

“Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto Tecnico per il Turismo di Acquappesa” sito in via P. Mancini, Acquappesa (CS),

- GANTT -

Premessa

Gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 lungo tutto la costa Tirrenica, hanno causato notevoli disservizi e danni, tanto da spingere la Regione Calabria, a dichiarare lo stato di emergenza.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione Calabria ha individuato con apposita Ordinanza un piano di interventi per l'immediato ripristino delle opere che, a seguito dell'evento meteorologico, sono stati dichiarati inagibili o, comunque, sono diventate tali da non essere più fruibili dall'utenza a cui erano destinate.

A seguito dell'Ordinanza emanata del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 653 del 20 marzo 2020 *“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia”*, in data 19/10/2020 è stata predisposta apposita convenzione tra la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza, diventato Ente Attuatore, per lo svolgimento di uno dei lavori previsti nel piano di interventi, ed in particolare quello che interessa l'istituto tecnico per il turismo di Acquappesa (CS).


A seguito di ciò con la determina dirigenziale n°2020001916 del 09/11/2020, è stato individuato il gruppo di lavoro ed, in particolare, incaricato il sottoscritto ing. Michele Fida della progettazione e direzione lavori di che trattasi.

GANTT

Si riportano di seguito le varie fasi individuate per il lavoro in oggetto con la stima dei tempi di esecuzione.

ATTIVITA'				SETTIMANA LAVORATIVA							PERIODO		
LIVELLO 1	LIVELLO 2	Durata (gg)	L	M	M	G	V	S	D	DATA INIZIO	Durata (gg)	DATA FINE	
APPRESTAMENTO CANTIERE	APPRESTAMENTO CANTIERE	1								gio 01/04/21	1	gio 01/04/21	
	APPRESTAMENTO CANTIERE OPERE SPECIALI	1								ven 02/04/21	1	ven 02/04/21	
OPERE SPECIALI	REALIZZAZIONE PALANCOLATA	6								dom 04/04/21	7	sab 10/04/21	
	REALIZZAZIONE PALI DI GROSSO DIAMETRO	15								mer 28/04/21	17	ven 14/05/21	
	SCAPITOZZATURA + SCAVO QUOTA FONDAZIONE	6								sab 15/05/21	7	ven 21/05/21	
	REALIZZAZIONE FONDAZIONE MURI	28								sab 22/05/21	33	mer 23/06/21	
OPERE IN C.A. fondazione + elevazione	REALIZZAZIONE ELEVAZIONE MURI	28								gio 24/06/21	33	lun 26/07/21	
	POSA CONDOTTA + RIEMPIMENTO A TRATTI	6								mar 27/07/21	7	lun 02/08/21	
	LAVORI DI FINITURA MURI	6								mar 03/08/21	7	lun 09/08/21	
	DEMOLIZIONE MASSETTO	1								sab 03/04/21	1	sab 03/04/21	
COMPLETAMENTO	DEMOLIZIONE MURO + SBANCAMENTO	20								dom 04/04/21	24	mar 27/04/21	
	MASSETTO PIAZZALE	6								mar 10/08/21	7	lun 16/08/21	
	FINITURE + SMOBILIZZO CANTIERE	5								mar 17/08/21	5	sab 21/08/21	
												150	

GANTT LAVORI SP,250

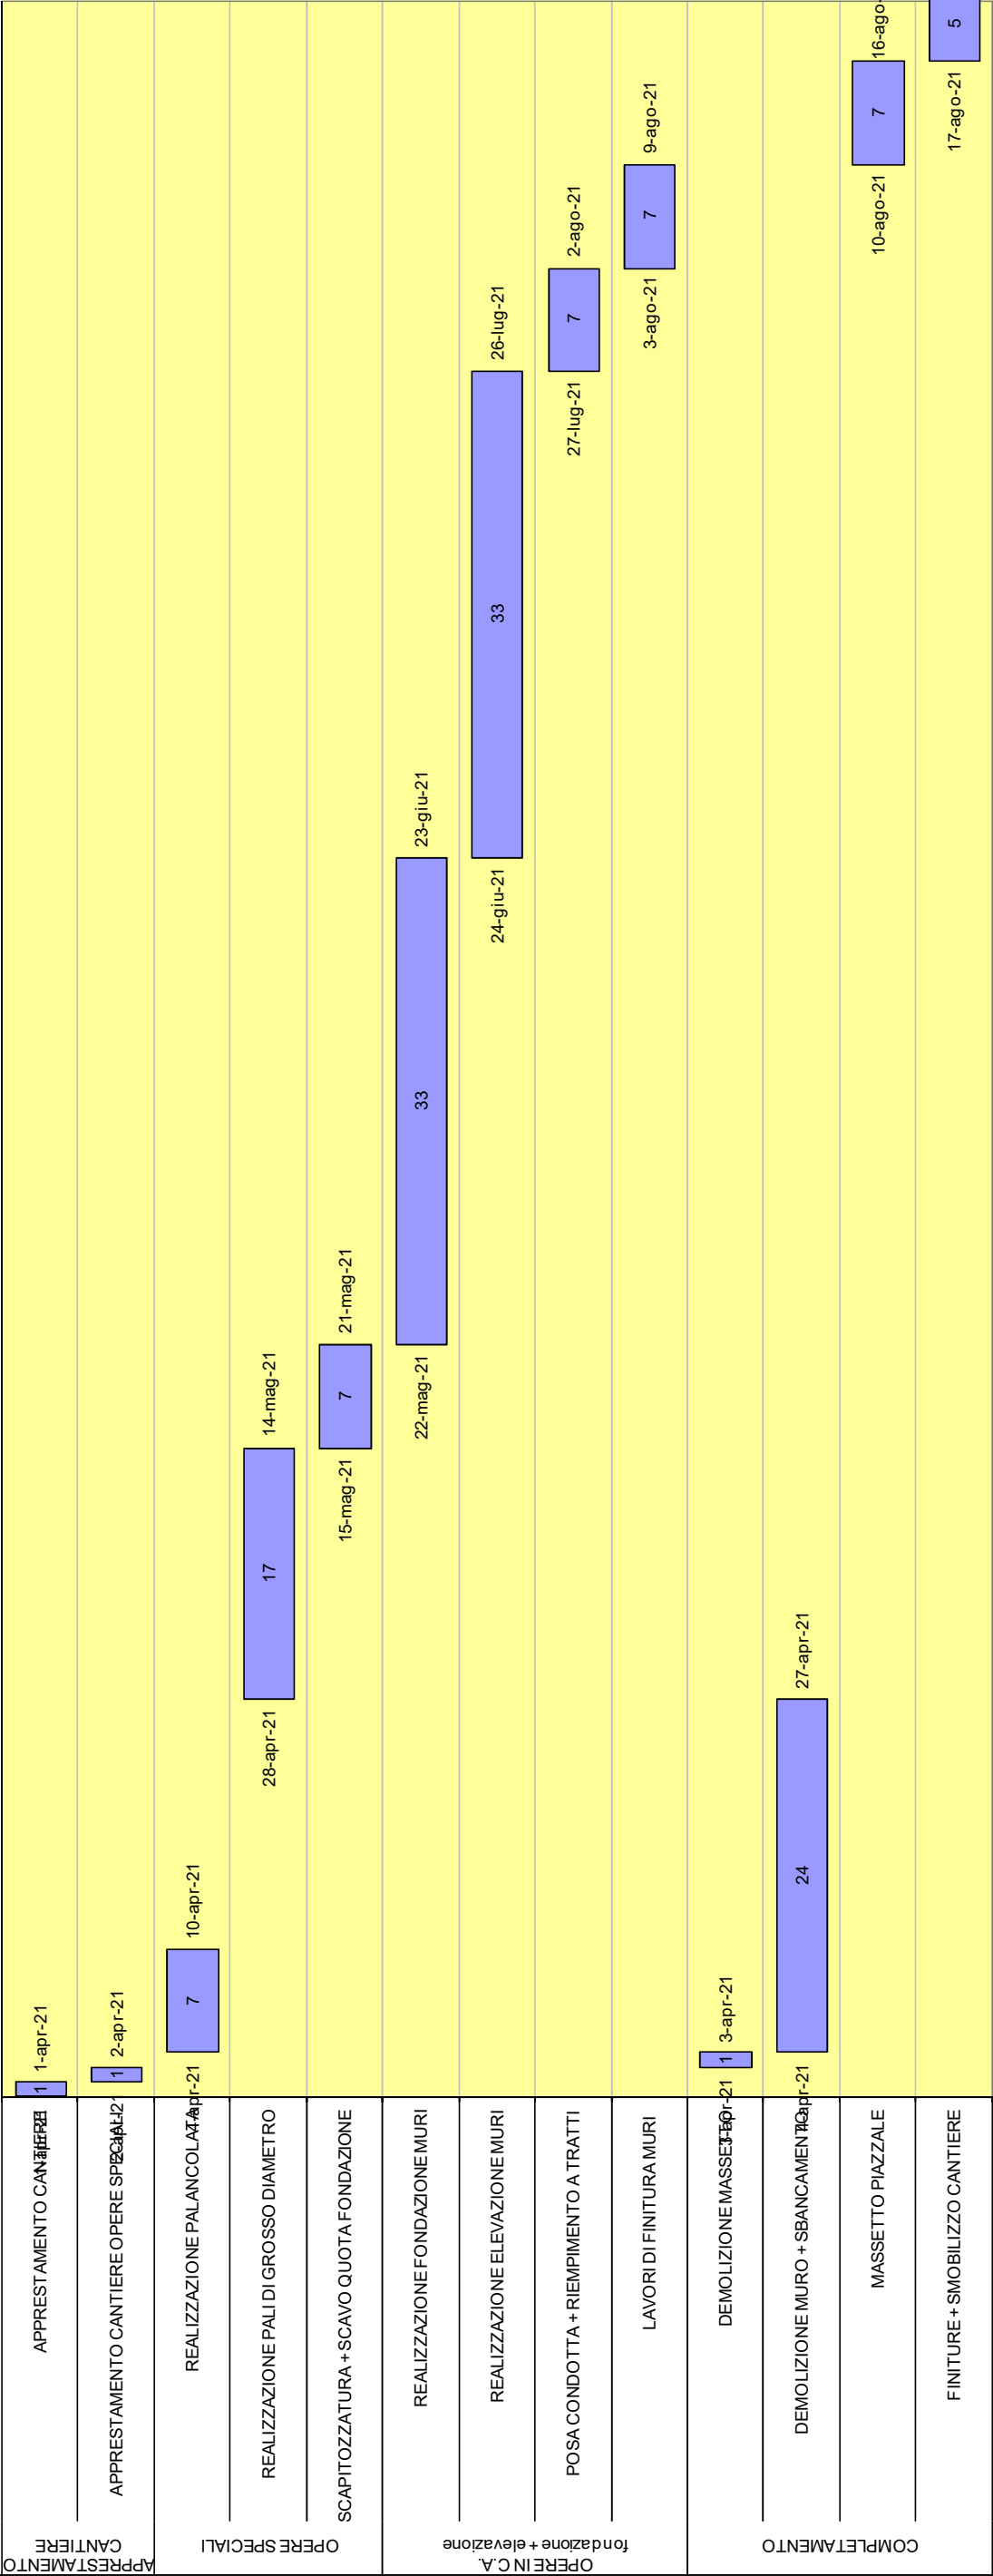

Sommario

Premessa.....	1
GANTT	2
